Playbook de Implantação

Plataforma de Governança Integrada e Gestão Estratégica

Campo Novo do Parecis (CNP/MT)

Desenvolvido por IGCP metalink

O Desafio da Gestão: Equilibrar Discurso e Técnica

Plataforma de Governo

O prefeito tem um mandato legitimado pelas urnas e pressa para entregar resultados.

A Rigidez da LRF

Limita a expansão de gastos, exigindo viabilidade técnica e dotação financeira para cada nova ação.

Continuidade vs. Inovação

Acomodar novas metas sem sucatear serviços essenciais já previstos no orçamento anterior.

A missão é converter desejos políticos em realidade dentro do Plano Plurianual (PPA), com rastreabilidade total.

Diretrizes Estratégicas: Maturidade em Governança

Gestão por Impacto

Foco em indicadores de resultado robustos para auditorias e compreensíveis para o cidadão.

Quebra de Silos

Responsabilidade compartilhada entre secretários e diretores, alimentando um sistema único.

O Papel do PRONAGOV

Implementação de ferramentas de excelência que blindam a prefeitura contra desperdícios, baseadas no Índice de Governança Municipal (IGovM).

Do Plano de Governo à Entrega de Valor

Programa de Governo

Inter

Eixos e Sub-Eixos (Liderança, Estratégia, Controle)

PPA (Programas)

Inter

O endereço orçamentário da iniciativa.

KPIs

Inter

Os indicadores de sucesso vinculados.

Ações (5W2H)

Inter

A frente de execução prática e o plano de ação detalhado.

O sistema garante a linha de coerência: toda promessa tem uma ação correspondente na LOA/PPA.

Arquitetura Tecnológica: 100% SaaS e Cloud

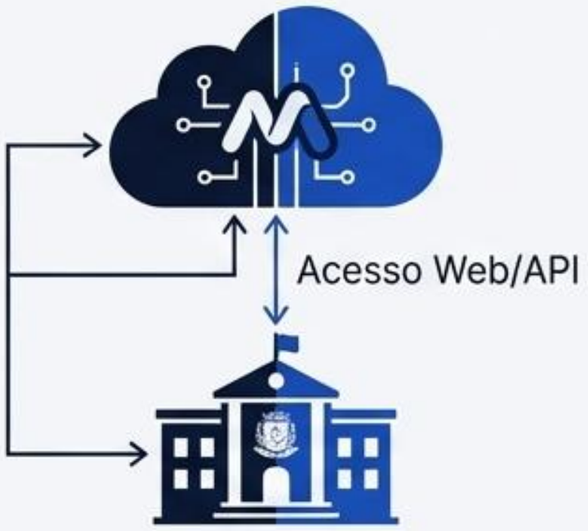

Zero Servidores Locais

Sem instalação on-premises. O cliente utiliza sempre a versão mais estável e atualizada.

Gestão MetaLink

Toda a administração de ambiente, host, escalabilidade e performance é responsabilidade técnica exclusiva da MetaLink.

Segurança e Integridade

Rotinas automatizadas de backup, recuperação e gestão de certificados em ambiente em nuvem altamente seguro.

O Plano de Voo: Campo Novo do Parecis (CNP/MT)

Fase 1: Preparação

Sprints 1 e 2

Alinhamento, infraestrutura e carga inicial de dados.

Fase 2: Aplicação

Sprints 3 e 4

Treinamento prático nos módulos estratégicos e PRONAGOV.

Fase 3: Operação

Sprints 5 e 6

Monitoramento, ritmo de gestão e consolidação do piloto.

Um ciclo ágil desenhado para transformar dados em operação funcional em aproximadamente 9 semanas.

Roadmap de Milestones Críticos (Março – Maio 2026)

12/03/2026

Kick-Off Oficial CNP/MT.

03/04/2026

MARCO: Preparação do Ambiente e Carga Concluída.

17/04/2026

MARCO: Ciclo de Capacitação e Aplicação Finalizado.

18/05/2026

MARCO: Operação CNP/MT Implementada.

O cronograma é focado exclusivamente nas atividades do escopo piloto do município, garantindo entregas tangíveis semana a semana.

Fase 1: Preparação (Março a Abril/2026)

Sprint #1 (12/03 a 27/03): Setup e Alinhamento

- Reunião de Kick-Off.
- Disponibilização dos templates básicos de coleta de dados.
- Configuração e preparação do ambiente em nuvem.

Sprint #2 (30/03 a 03/04): Dados e Carga

- Recebimento dos templates preenchidos pela prefeitura.
- Realização das cargas iniciais no sistema.
- Apresentação da carga validada no dia 03/04.

ATENÇÃO: A devolução pontual dos templates é o gatilho crítico para o sucesso desta fase.

Fase 2: Aplicação e Capacitação (Abril/2026)

Sprint #3 (Início 06/04): Estratégia e Projetos

Treinamento na manutenção do Plano Estratégico.

Treinamento no módulo de Gestão de Projetos (cadastros e fluxos).

Sprint #4 (Meados de Abril): PRONAGOV e Indicadores

Capacitação nas metodologias do PRONAGOV.

Treinamento sobre como cadastrar, alimentar e monitorar KPIs.

Metodologia de Ensino

Formato híbrido com engajamento ativo, apoiado por vídeos, tutoriais e manuais de autoaprendizagem.

Fase 3: Operação e Monitoramento (Maio/2026)

Sprint #5 e #6 (Até 18/05): A Máquina Girando

- **Ritmo de Gestão:** Estabelecimento de reuniões de acompanhamento utilizando os painéis do sistema em tempo real.
- **Monitoramento do Ciclo:** Avaliação da fluidez dos dados (Ações 5W2H sendo atualizadas pelos responsáveis).
- **Ajustes Finais:** Lapidação de fluxos e sanar dúvidas residuais da equipe.

Entrega Final: No dia 18/05/2026, **o piloto de Campo Novo do Parecis é oficialmente considerado operacional e integrado.**

Matriz de Responsabilidades do Ecossistema

1. Prefeitura de CNP/MT (O Negócio)

- Saneamento e organização de dados originais.
- Veracidade técnica e alimentação dos KPIs e PPA.
- Engajamento dos servidores nos treinamentos.

2. IGCP (A Metodologia)

- Governança do programa PRONAGOV.
- Sublicenciamento do software e interface comercial com o município.
- Apoio consultivo e mentorias.

3. MetaLink (A Tecnologia)

- Disponibilidade da plataforma (Uptime) e infraestrutura Cloud.
- Segurança da informação e execução de evoluções técnicas e atualizações.

O Seu Papel no Sucesso do Projeto

Carga Inicial e Saneamento

A preparação, limpeza e organização dos dados em planilhas para a carga inicial é de inteira responsabilidade do município. O software não cria dados que não existem.

Veracidade dos KPIs

A autoria e a atualização periódica dos indicadores inseridos são exclusivas das secretarias. O sistema reflete a disciplina da equipe.

Proatividade na Capacitação

O modelo híbrido exige que a equipe assista aos vídeos e consulte a base de conhecimento antes e durante as atividades práticas. O protagonismo é do servidor.

O Modelo de Suporte Contínuo

Canais de Atendimento

A

Plataforma de Chamados: Canal oficial (tickets) para incidentes.

B

Base de Conhecimento: Acesso 24/7 a vídeos e manuais.

Acordos de Nível de Serviço (SLA) & Updates

- **Erros Menores (Dúvidas/Estética):** Resposta em até 24 horas úteis.
- **Hotfixes:** Falhas críticas são corrigidas e publicadas imediatamente.
- **Bug Fixes:** Inconsistências de baixa severidade em pacotes mensais.
- **Evoluções:** Novas funcionalidades em releases trimestrais.

(Atualizações sempre fora do horário comercial).

Premissas e Restrições do Projeto

Modelo 100% Remoto

Toda a implantação, reuniões, **configurações** e treinamentos ocorrem **online.**
Não estão previstos deslocamentos ou visitas presenciais.

Hierarquia Obrigatória do PPA

O sistema exige **alinhamento** absoluto à matriz de **Governança** (Programa > KPI > Ação). Não suportamos estruturas fora deste padrão **metodológico.**

Ambiente SaaS Fechado

A infraestrutura é centralizada. **Conectividade** externa apenas **via interface oficial ou APIs documentadas** (sem acesso direto a banco de dados local).

Gestão de Riscos e Mitigações

Principais Ofensores da Implantação		
	Risco	**Mitigação**
1	Atraso na devolução dos templates preenchidos.	Alinhamento rigoroso das datas na Sprint 1 e priorização na agenda dos secretários de CNP/MT.
2	Falta de aderência à arquitetura do PPA.	IGCP fornecerá suporte consultivo inicial para adequar o plano de governo municipal à estrutura de Programas e Ações exigida pelo sistema.
3	Baixo engajamento da equipe técnica.	Liderança ativa do prefeito e diretores para instituir o Ritmo de Gestão como rotina obrigatória a partir de maio.

A tecnologia é o habilitador; a disciplina da gestão de Campo Novo do Parecis é o motor do sucesso.
